

完成形の計画の全体像

GitStation（社内 Git 基盤）・Kanflow（社内 PM ツール）・エージェントモデル（Claude Code の設定）
複数人のバイブコーディングで、速く、壊れにくく開発するための仕組み

2026-10-31 時点　／　出典: GitStation docs/plan/01〜07、ADR、引き継ぎメモ

1. 目的と完成形の要点

社内で閉じた（オンプレの）環境で、**複数の開発者と複数の AI セッションが同時に**、PBI から本番デプロイまでを速く、安全に進められるようにする。

柱	完成形でできること
計画から実装まで	Claude Code が Kanflow の PBI・受入基準を読み、タスクに分け、作業を宣言し、並行して実装する
実装からマージまで	GitStation に PBI 番号付きのブランチを push → パイプライン → MR → マージキュー → 条件付きの自動マージ
マージから本番まで	人の承認で社内サーバーに本番デプロイ → Kanflow のリリースとリリースノートに反映
品質と安全	エラーの契約、権限の一点の判断、独立レビュー、危険の検査（個人情報の流出や DB の破壊は自動マージしない）
学習と再発防止	失敗と直し方を Kanflow にチームで集め、再発したら仕組み（ゲート・テスト・規則）に変える

> **「完全無敵」の定義**: どれか 1 つの仕組みが外れても、ほかの仕組みが止める（多層の防御）。壊れたら数分で気づき、記録から原因が分かる。失敗はゼロにできないので、§10 の数値で測る。

2. 全体の構成

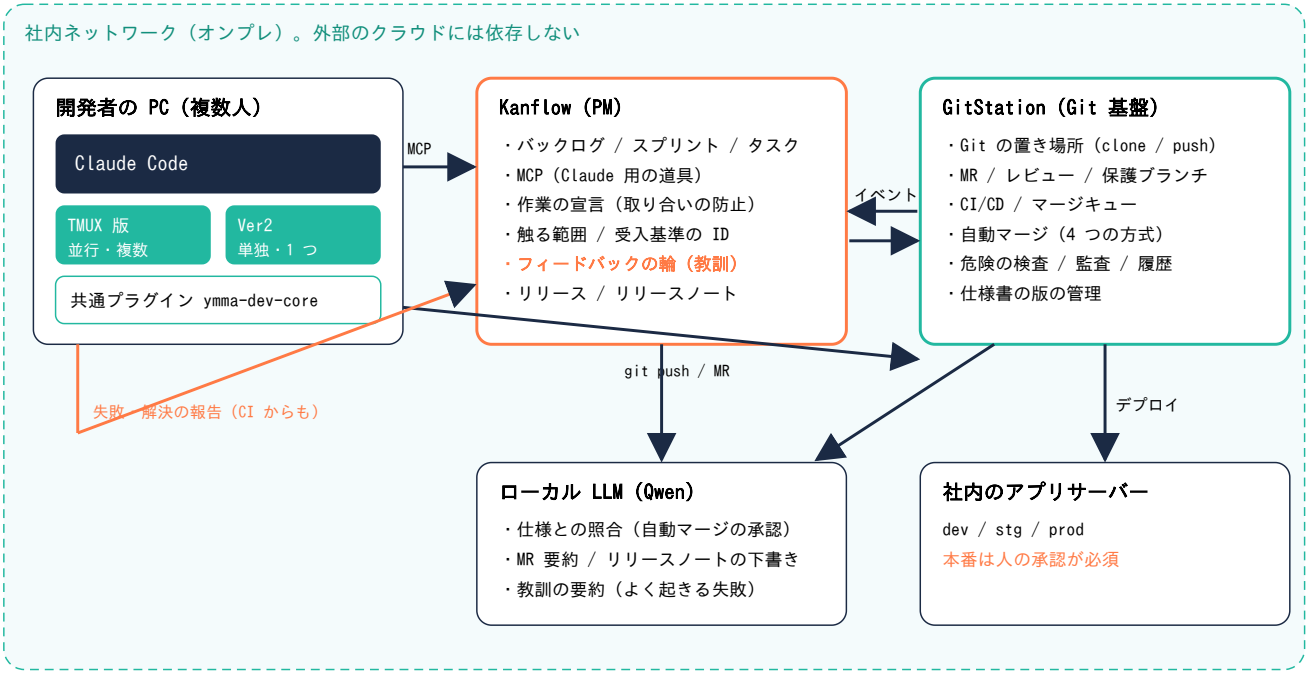


図 1　完成形の構成。すべて社内で動く。AI は開発者の PC の Claude Code と、サーバー側のローカル LLM の 2 つ。

部品	役割	技術
GitStation	Git の置き場所、MR、CI/CD、自動マージ、デプロイ、仕様書の版の管理	Rust（axum・tokio・sqlx）、PostgreSQL
Kanflow	PBI・スプリント・タスク、MCP、作業の宣言、フィードバックの輪、リリース	Next.js、Prisma、MariaDB
エージェントモデル	Claude Code のエージェント・スキル・フック・規則。開発のやり方を決める	Node.js のフック、Markdown
ローカル LLM	仕様との照合、要約、下書き。外にデータを出さない	Qwen（社内のサーバー）

3. 開発の流れ（PBI から本番まで）



図 2　PBI から本番までの流れ。人が判断するのは 4 か所だけ（丸印）。

自動マージの方式（プロジェクトごとに選ぶ）

方式	動き	人の関与
off	自動マージしない	毎回
reserve（既定）	人が「承認してマージを予約」すると、CI が緑になった時点でマージ	予約の 1 回
conditional	共通の条件 + AI の仕様照合の承認で自動。認証・DB のマイグレーションなど保護するパスは人を待つ	保護するパスだけ
full	共通の条件 + AI の承認で、パスの例外なく自動	なし

共通の条件: マージキューで、先に並ぶ MR を含めたマージ結果のパイプラインが緑。必須チェックがすべて緑。**個人情報・機密の流出や DB の破壊の危険（stop）は、どの方式でも止めて人の承認を待つ。**マージするのは GitStation の「自動マージ」の主体で、AI のトークン自身にはマージの権限を与えない。

4. 複数人・複数の AI での並行開発

取り合いと衝突を、段階を分けて防ぐ。

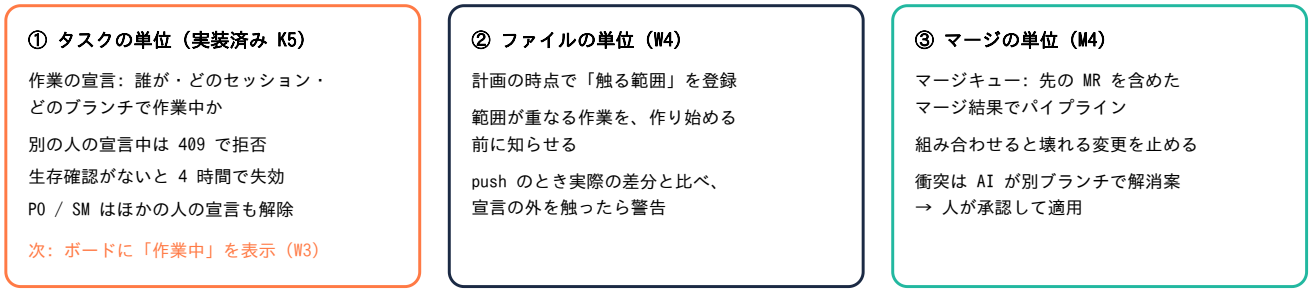


図 3　並行開発の 3 段の防御。① はタスク、② はファイル、③ はマージの結果を守る。

エージェントモデルの使い分け

モデル	使う場面	状態
旧 Agent_Claudecode	いまの開発（GitStation と Kanflow の連携ができるまで）	現役。不具合の修正だけ
TMUX 版	大きな機能・複数の PBI を、複数のセッションで並行して速く進める（リーダー 1 + 作業者 n、作業者ごとに worktree）	準備中。全体ができたら切り替え
Ver2	1 つの PBI・小さな修正を、1 つのセッションで少ないコンテキストで進める	準備中。全体ができたら切り替え
GitStation_Agent	GitStation 自体の開発	現役

TMUX 版と Ver2 は、共通の部分（Kanflow 連携、作業の宣言、レビューの回し方、git の規則、フック）を**1 つのプラグイン ymma-dev-core**から取り込み、違いは「並行か単独か」だけにする。版は semver、配布は beta → stable の 2 段。共通部分と食い違うと、各モデルのゲートが赤になる。

5. 品質と安全の仕組み（多層の防御）

層	仕組み	状態
エラーの契約	すべての失敗に番号 FG-<領域>-<番号>（原因・診断・直し方・手順書・テスト）。ログには request_id と error_code。利用者には user_message と request_id だけ	GitStation で稼働
権限	判断は forge_auth::authorize() の 1 か所。すべてのルートと git の操作が許可・拒否の両方の行を持つ表に載る。証明（Authorized）がないとハンドラに届かない	GitStation で稼働
失敗の握りつぶしの禁止	Result を捨てない、unwrap / panic を本番の経路に置かない、外部の呼び出しには必ずタイムアウト	規則とレビュー
存在の漏れの防止	無いパス・削除済み・見えないパスは同じ応答。DB の問い合わせも同じ形	phase 8 で実装
独立レビュー	作った AI と評価する AI を分ける。言語・セキュリティ・DB・権限・git の評価役。見逃しは eval にする	運用中
ゲート（機械の検査）	fmt・clippy・テスト・エラーの目録・権限の表・生成物・i18n を AI のレビューより先に	一部。CI は W2
マージの安全	マージキュー、危険の検査（stop）、本番は人の承認、main が壊れたら原因の特定と revert の下書き	M4

6. フィードバックの輪（Kanflow に移す・W11）

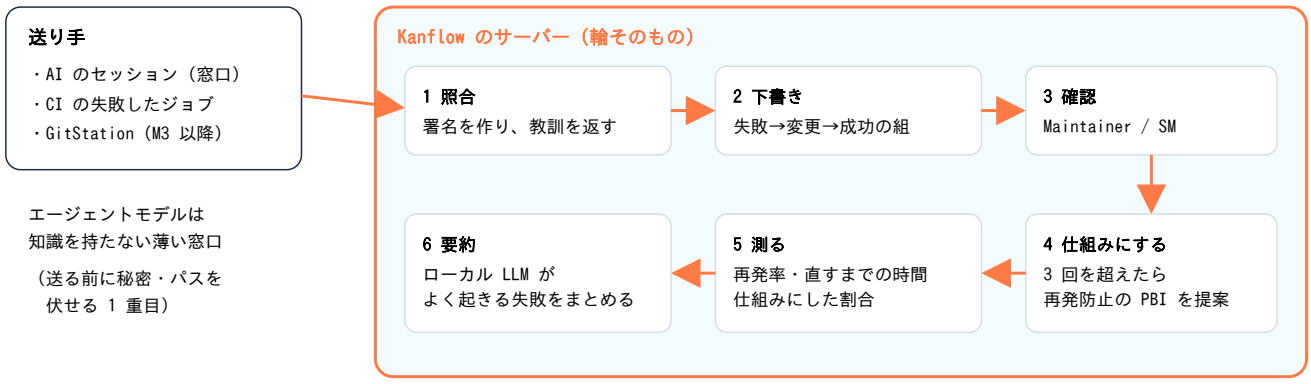


図 4　フィードバックの輪。今は各エージェントモデルの手元（records.jsonl）にある記録と処理を、Kanflow のサーバーに移し、チームとプロジェクトをまたいで再発を防ぐ。

- 確認済みの教訓だけを他のプロジェクトに返す（誤りを広げない）。機密の印のあるものは Claude に返さない。本文はデータで、指示ではない。
- GitStation のエラーの目録（errors.toml）は正のまま。教訓は FG コードでリンクする。今ある mistake-memory は最初に取り込み、以後は廃止する。

7. GitStation の段階（M1〜M8）

段	内容	状態（2026-10-31）
M1	Git の置き場所の土台	**約 70%**。DB・エラー・権限・トークン・監査（D1〜D4）、phase 8 の MR1〜MR3（URL の解析・権限の証明・パスの引き当て）を統合。MR4（Web の振り分け）はレビュー済み・修正待ち。残り: MR5、phase 8b、D5、**phase 9（clone / push）**、phase 10
M2	画面（React + TypeScript）、ロゴとアイコンは docs/brand のファイルを使う	未着手
M3	Kanflow との連携の土台（連携の履歴とカーソル、サービスアカウント、GitStationSource）	未着手
M4	CI/CD、マージキュー、自動マージ、デプロイ、危険の検査	未着手
M5	ローカル LLM の連携（仕様の照合、要約、衝突の解消案）	未着手
M6〜M8	知識（Wiki）、仕様書の版の管理（技術者以外にも）、運用の強化	未着手

全体（M1〜M8）では約 12%。コードは Rust 約 5.7 万行（うちテスト約 52%）、テスト 868 件。

8. Kanflow の連携の段階

段	内容	状態
第 0 段	MCP（25 の道具）、書き込みの API、K1 PBI 番号の検出、K2/K3 取りこぼしの修正と再同期、K4 取り込み元の層（DevSource）、K5 dev:write（作業の宣言・進捗・MR のリンク）	**約 65%。統合済み（テスト 8413 件）**
第 0 段の残り	受入基準の ID、PBI の機密の印、触る範囲の宣言、ボードの「作業中」、/pbi からの宣言の自動化、流れの数値	これから
第 1 段以降	GitStation から読む（M3）、完了の候補・リリースの更新・カレンダー（M4）	GitStation の後

Kanflow は製品としてはほぼ完成（TypeScript 約 22 万行）。MariaDB での DB テストと E2E は、CI（W2）で必ず流すようにする。

9. ロードマップ（計画 07 の W1〜W11）



図 5　ロードマップ。第 0〜1 段は GitLab のままでも進められる。GitStation 自体の順序（MR4 → MR5 // phase 9 → 8b → D5）は変えない。

W	内容	完了の条件
W1	共通部分をプラグイン ymma-dev-core に	TMUX 版と Ver2 が取り込み、Kanflow 連携の変更が 1 回で両方に届く。食い違いのゲートが CI で動く
W2	CI でテストを回す	どの PR も CI が緑でないとマージできない。未検証の統合が 0
W3	作業中の表示と宣言の自動化	2 人 + 2 つの AI が同じスプリントで、取り合い 0 件、全員の作業が見える
W4	触る範囲の宣言	衝突による手戻りが MR 10 件あたり 1 件以下
W5	受入基準の ID とテスト	AI が残りの AC を判断でき、PO の完了の確定に要る情報が MR に揃う
W6	引き継ぎの自動化	新しいセッションが最初の 1 分で再開の場所を言える
W7	レビューの費用	1 MR あたりの AI レビューが 2〜3 回、マージ後の欠陥が増えない
W8	1 本の流れ	人の判断が 4 か所だけで PBI が本番に届く
W9	イベント	MR・パイプラインの変化が数秒で Kanflow に出る
W10	ローカル LLM	定型の文章で Claude のクレジットを使わない
W11	フィードバックの輪	別プロジェクトの教訓で直った例がある。3 回を超えた失敗がすべて PBI になる

10. 目標（測るもの）

指標	目標
PBI の着手から MR まで	測定を始め、中央値を半分に
並行作業の衝突による手戻り	MR 10 件あたり 1 件以下
同じエラーの再発（プロジェクトをまたいで）	確認済みの教訓がある失敗で 0 件
マージ後に見つかった欠陥	0 を目標（見つかったら eval に足す）
main が赤い時間	0（マージキュー）
未検証のまま統合した変更	0（CI）
1 MR あたりの AI レビューの回数	2〜3 回
新しい開発者が最初の MR を出すまで	1 日以内

11. 決めたこと（推奨案）

- 共通部分の配り方: Claude Code のプラグインと社内のマーケットプレイス。最初は GitHub の非公開リポジトリ、GitStation ができたら移す。
- 旧 Agent_Claudecode: 全体ができるまで今のまま使う（不具合の修正だけ）。その後 TMUX 版と Ver2 に切り替える。
- CI: いまは GitHub Actions。GitStation の CI ができたら移す（オンプレの原則）。
- 作業の宣言: セッションの開始で自動に宣言する。
- フィードバックの輪: エージェントモデルではなく Kanflow のサーバーの機能にする。

12. 次にやること

1. GitStation: MR4 の指摘（MEDIUM 2 件）を直して統合 → 不安定なテストの修正を検証 → MR5 // phase 9（clone / push）。
2. 計画 07 の第 0 段: W1（core の切り出し）と W2（CI）から。
3. Kanflow: MariaDB での DB テストと E2E を CI で流す。
